1．　システム化の目的と範囲・・・・・・・・・・・1-1

2．　対応概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-1

3．　特記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-1

4．　スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・4-1

5．　納品成果物・・・・・・・・・・・・・・・・・5-1

見積条件書	システム名称	POSサーバー切替(ルビナ化)に伴う対応		作成者	渡邊	作成日	2025/01/25
	資料名称	1．システム化の目的と範囲		改訂者		改訂日	

■システム化の目的と範囲

目的/背景
・ カスミ様親会社(USMH)にて傘下のスーパーマーケットのPOSシステムを統合するため、現行のPOS/POSサーバーのリプレースを計画されております。 ・ POSサーバーに関しては、現行のVINX社からルビナソフトウエアジャパン社(ルビナ社)にリプレースを予定されております。 ・ POSサーバーの切替は2025年9月を最初の店舗とし、店舗単位で順次切替します。切替期間中はVINX社とルビナ社のPOSサーバーが並行稼働します。

対応内容/範囲
・ カスミ様店舗のSHARPOPとPDAは、POSサーバー上のAPIをコールすることで商品・売価情報等を取得・更新しております。 新POSサーバー(ルビナ社)につきましては、現行POSサーバー(VINX社)とAPIのインターフェースおよび機能は同一の前提とします。 新POSサーバー(ルビナ社)に対する、SHARPOPとPDAのAPI検証はカスミ様にて実施頂きます。 ・ 対応方針は以下となります。

No	対象	対応方針	対応内容
1	SHARPOPクライアント	お客様で店舗毎に接続先設定変更を実施頂きます。	お客様で店舗毎に接続先設定変更ができるツールを開発・提供します。
2	SHARPOPサーバー	シャープで動作検証を実施します。	新POSサーバーからマスター受信できることを検証します。
3	PDA(Webサーバー)	お客様で店舗毎に接続先設定変更を実施頂きます。	店舗毎に接続先を変更できるようにPDAのWebサーバーを改修します。
4	PDA(SBサーバー)	シャープで動作検証・設定変更作業を実施します。	新POSサーバー向けに棚割マスタ(P003)ファイルを連携するようにタスク設定を追加します。 現行POSサーバー稼働終了次第、現行POSサーバー向けのファイル連携タスクを停止します。
5	PDA	Webサーバーで対応するため、PDA端末に対して対応なし	

・ 全体構成図

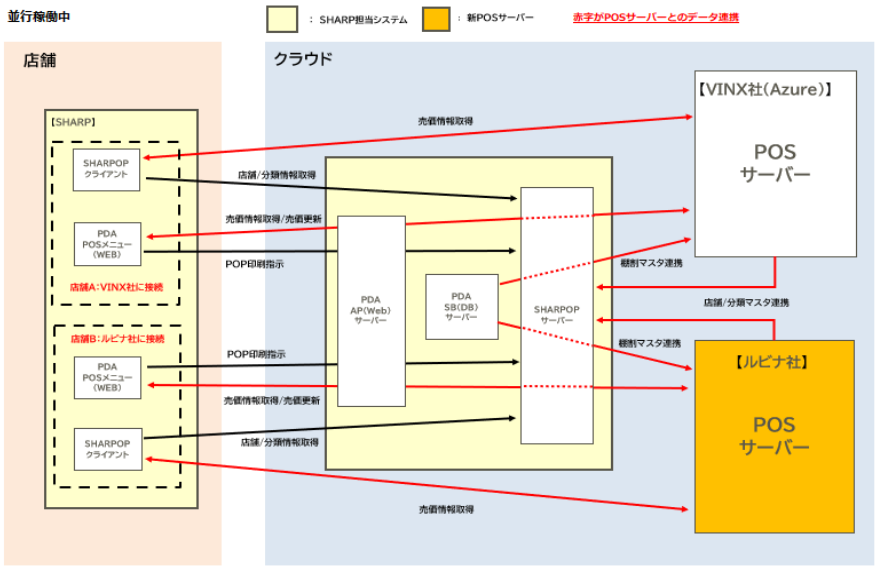

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION

■対応概要

No	対象	対応方針	対応内容
1	SHARPOPクライアント	お客様で店舗毎に接続先設定変更を実施頂きます。	お客様で店舗毎に接続先設定変更ができるツールを開発・提供します。

■ツールの仕様は以下となります。
①クライアント毎にセットアップして動作するツールとします。
②店舗一覧を表示して選択、または店舗コードを入力すると、対象店舗向けのプログラム配信ファイルを作成します。
③②で作成したファイルをSHARPOPサーバーのリリースフォルダにコピーします。(ファイル共有でコピー)
④配信を取りやめる機能を実装します。(SHARPOPサーバーから配信ファイルを削除します。)
⑤配信結果を確認できる画面を実装します。
配信結果画面では、クライアントが配信ファイルを受け取ったかどうかの確認ができます。

■補足
①配信ファイルの構成は以下となります。

ファイル	ファイル名	説明
配信ファイル	Qyymmdd99.zip	ファイル名の説明　yy：西暦の下2桁、mm：月、dd：日付、99：連番 更新するファイルを圧縮しています。
対象店舗ファイル	Qyymmdd99.dat	拡張子以外は配信ファイル名と同じです。 テキスト内に、配信対象の店舗を記述します。

No	対象	対応方針	対応内容
2	SHARPOPサーバー	シャープで動作検証を実施します。	新POSサーバーからマスター受信できることを検証します。

■以下の内容で検証します。
①検証は開発機で実施します。
②対象のマスタは以下とします。

No	送信元	取込対象マスター
1	POSサーバー	店舗マスター
2	POSサーバー	大分類（部門）マスター
3	POSサーバー	中分類（品群）マスター
4	POSサーバー	小分類（品種）マスター
5	POSサーバー	分類マスター

③マスタがSHARPOPサーバーに連携されること、SHARPOPサーバーで問題なく取込できることを確認します。

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION

■対応概要

No	対象	対応方針	対応内容
3	PDA(Webサーバー)	お客様で店舗毎に接続先設定変更を実施頂きます。	店舗毎に接続先を変更できるようにPDAのWebサーバーを改修します。

■改修内容は以下となります。
①PDAのWebサーバーに、店舗ごとに、各APIの接続先(現行POSサーバー)を記載した設定ファイルを追加します。
②PDAについて、Webサーバーに設定ファイルが存在する場合、設定ファイル記載の現行POSサーバーに接続できるようにし、
設定ファイルが存在しない場合、新POSサーバーに接続できるようにします。

※店舗毎の現行サーバー⇒新サーバーの設定切替はカスミ様にて実施頂きます。
⇒PDAのWebサーバーにファイル共有で接続し、該当店舗の設定ファイルを削除頂くこととします。

No	対象	対応方針	対応内容
4	PDA(SBサーバー)	シャープで動作検証・設定変更作業を実施します。	新POSサーバー向けに棚割マスタ(P003)ファイルを連携するようにタスク設定を追加します。 現行POSサーバー稼働終了次第、現行POSサーバー向けのファイル連携タスクを停止します。

■以下の内容で検証・対応します。
①新POSサーバー向けに棚番マスタ(P003)ファイルを連携するようにタスク設定を追加します。
⇒新POSサーバーに棚番マスタ(P003)ファイルが問題なく、連携されることを検証します。
②現行POSサーバー稼働終了次第、現行POSサーバー向けのファイル連携タスクを停止します。
⇒現行POSサーバーへの棚番マスタ(P003)ファイルの連携が停止されることを確認します。

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION

■特記事項

1) SHARPOPクライアントとPDAのAPI機能検証はカスミ様にて実施頂く前提とします。
シャープで問い合わせフォローをさせていただきます。
※テスト手順書/仕様書の作成は実施しません。

2) SHARPOPクライアントとPDAの接続変更はカスミ様にて実施頂きます。

3) 各作業につきましては、幕張からリモート作業を予定しております。

4) 本見積に記載のない作業につきましては、別途お見積りとさせて頂きます。

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION

見積条件書	システム名称	POSサーバー切替(ルビナ化)に伴う対応		作成者	渡邊	作成日	2025/1/25
	資料名称	4．スケジュール		改訂者		改訂日	

■スケジュール

工程・主要作業		担当		スケジュール								
		カスミ様	シャープ	開始	終了	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
マイルストーン	【発注】											
	・ご発注	○		3/3	3/7							
	【設計】											
	・基本設計ご承認	○		4/21	4/25							
	【切替】											
	・SHARPOP/PDA切替作業	○		9/1	9/26							
	【検収】											
	・システム検収	○		10/20	10/20							
POSサーバー切替に伴う対応	【設計】											
	・基本設計作成		○	4/1	4/18							
	・基本設計ご承認	○		4/21	4/25							
	【製造/テスト】											
	・SHARPOP切替ツール製造		○	5/12	5/30							
	・PDA接続先切替改修		○	5/12	5/30							
	・結合テスト		○	6/2	6/30							
	・ユーザーテスト	○		7/1	8/8							
	【マニュアル】											
	・SHARPOP切替マニュアル作成		○	6/2	6/30							
	・PDA切替ツール製造作成		○	6/2	6/30							
	【リリース】											
	・リリース作業		○	8/18	8/22							
新POSサーバー	【API検証】											
	・SHARPOP/PDA　API検証	○		7/1	8/8							
	【新POSサーバー稼働】											
	・SHARPOP/PDA切替作業	○		9/1	9/26							

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION

見積条件書	システム名称	POSサーバー切替(ルビナ化)に伴う対応		作成者	渡邊	作成日	2025/01/25
	資料名称	5．納品成果物		改訂者		改訂日	

■納品成果物

納品対象に"〇"がついているものが納品対象となります。

NO	開発工程	作業内容	成果物	納品対象	納品時期	完了基準
1	基本設計フェーズ	基本設計書作成	基本設計書	〇	設計完了時	お客様のご承認
2	製造フェーズ	プログラム/ツール作成 単体検収作業	プログラム/ツール ソース	〇	テスト完了時	
3	検証フェーズ	ツール検証 データ連携検証 API接続先切替検証	テスト計画書 テスト結果報告書			
4	システム展開フェーズ	リリース手順書作成 リリース作業 SHARPOP切替マニュアル作成 PDA切替マニュアル作成	リリース手順書 SHARPOP切替マニュアル PDA切替マニュアル	 〇 〇	システム展開前	

SHARP MARKETING JAPAN CORPORATION
